


Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
 Grobbauphasen / Verkehrsführung

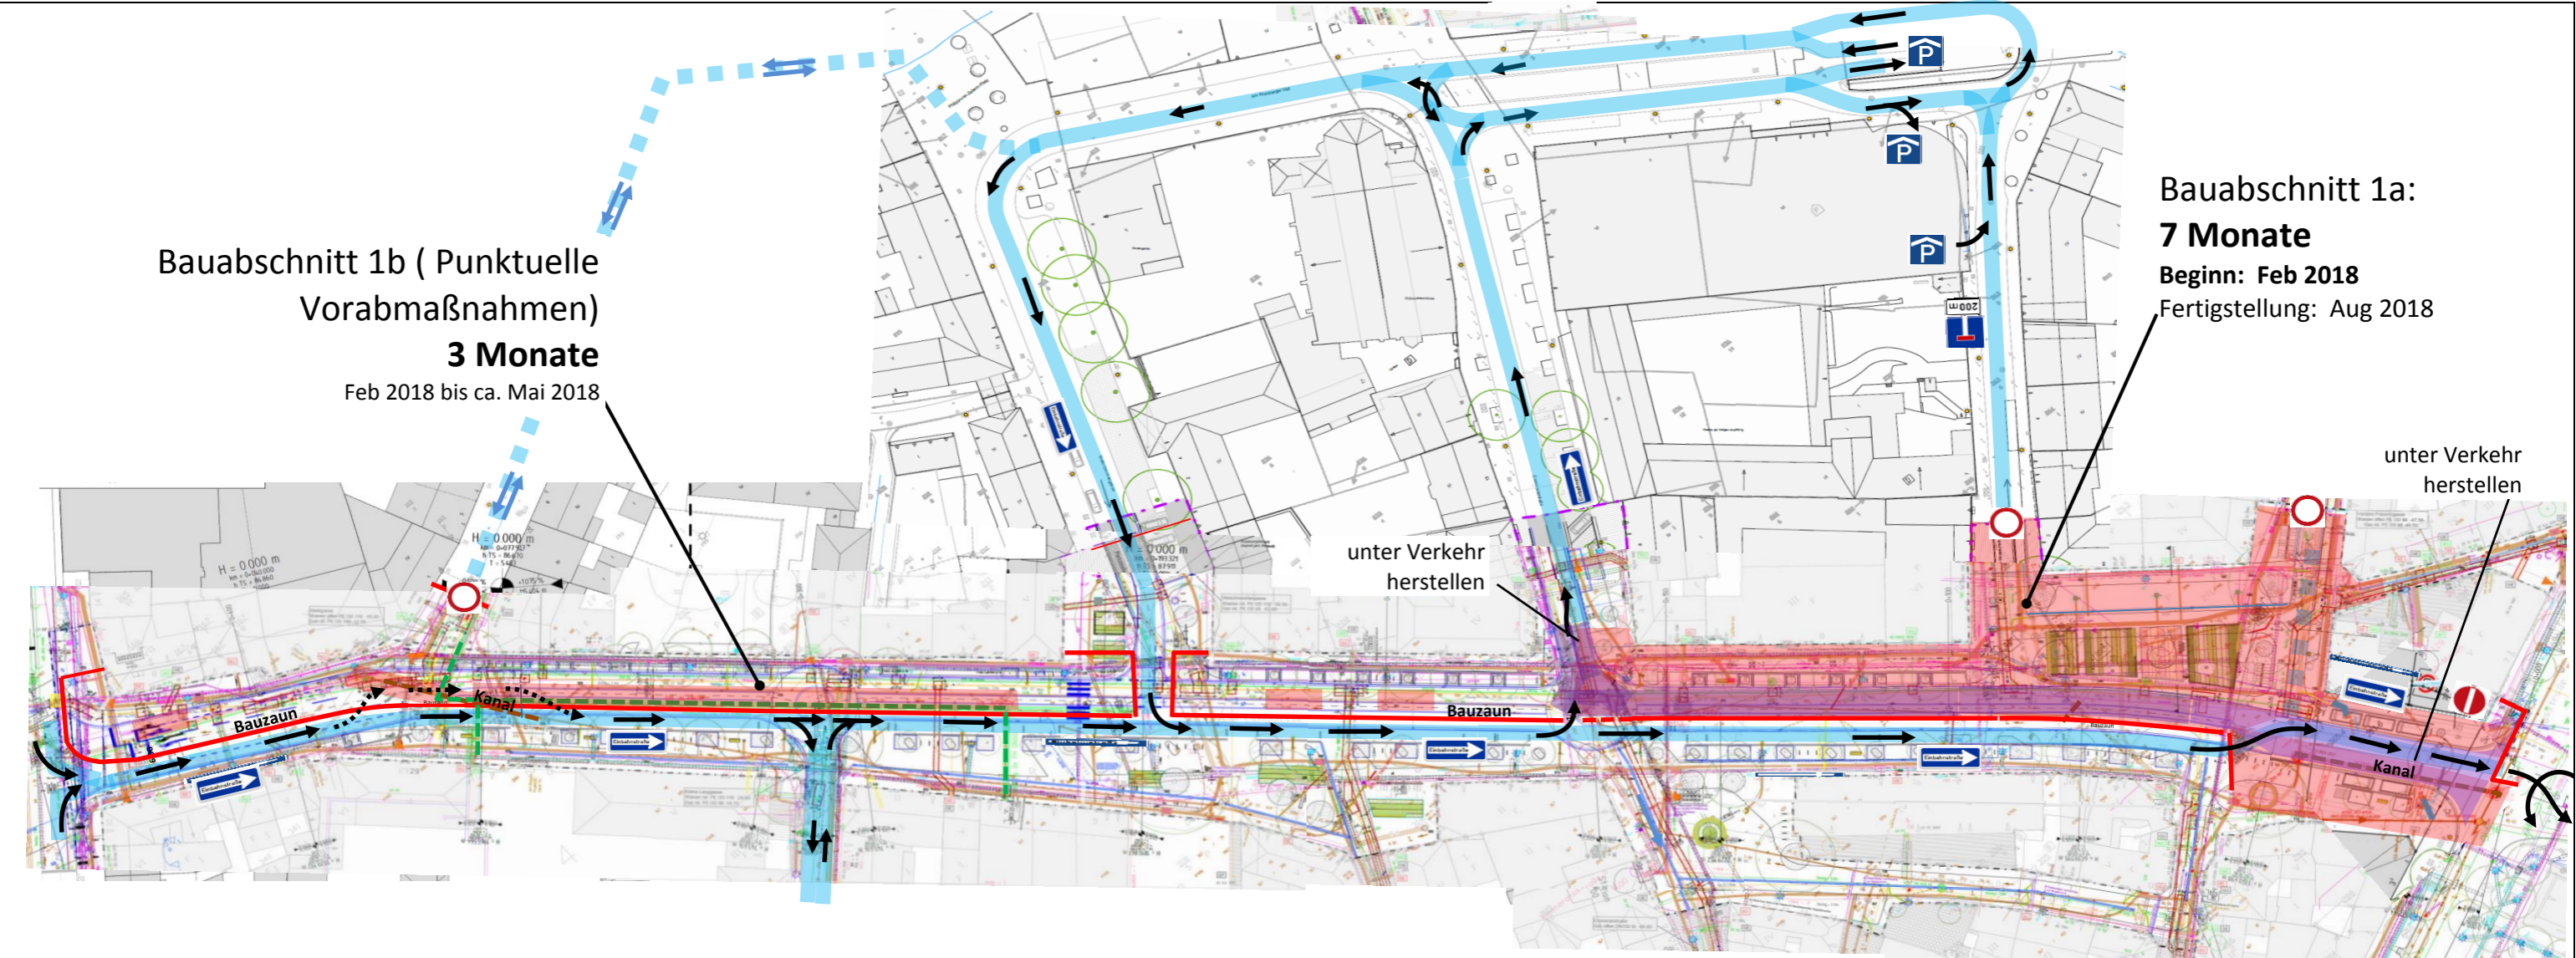

Bauabschnitt 1b (Punktueller Vorabmaßnahmen)
3 Monate
 Feb 2018 bis ca. Mai 2018


Bauabschnitt 1a:
7 Monate
 Beginn: Feb 2018
 Fertigstellung: Aug 2018

Legende:

- Verkehrsführung (Fahrstreifen)
- Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone)
- Fahrbahn, in Herstellung
- Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung
- Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun)
- Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun)

Bauphase A
Februar 2018 - Mai 2018

Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
Großbauphasen / Verkehrsführung

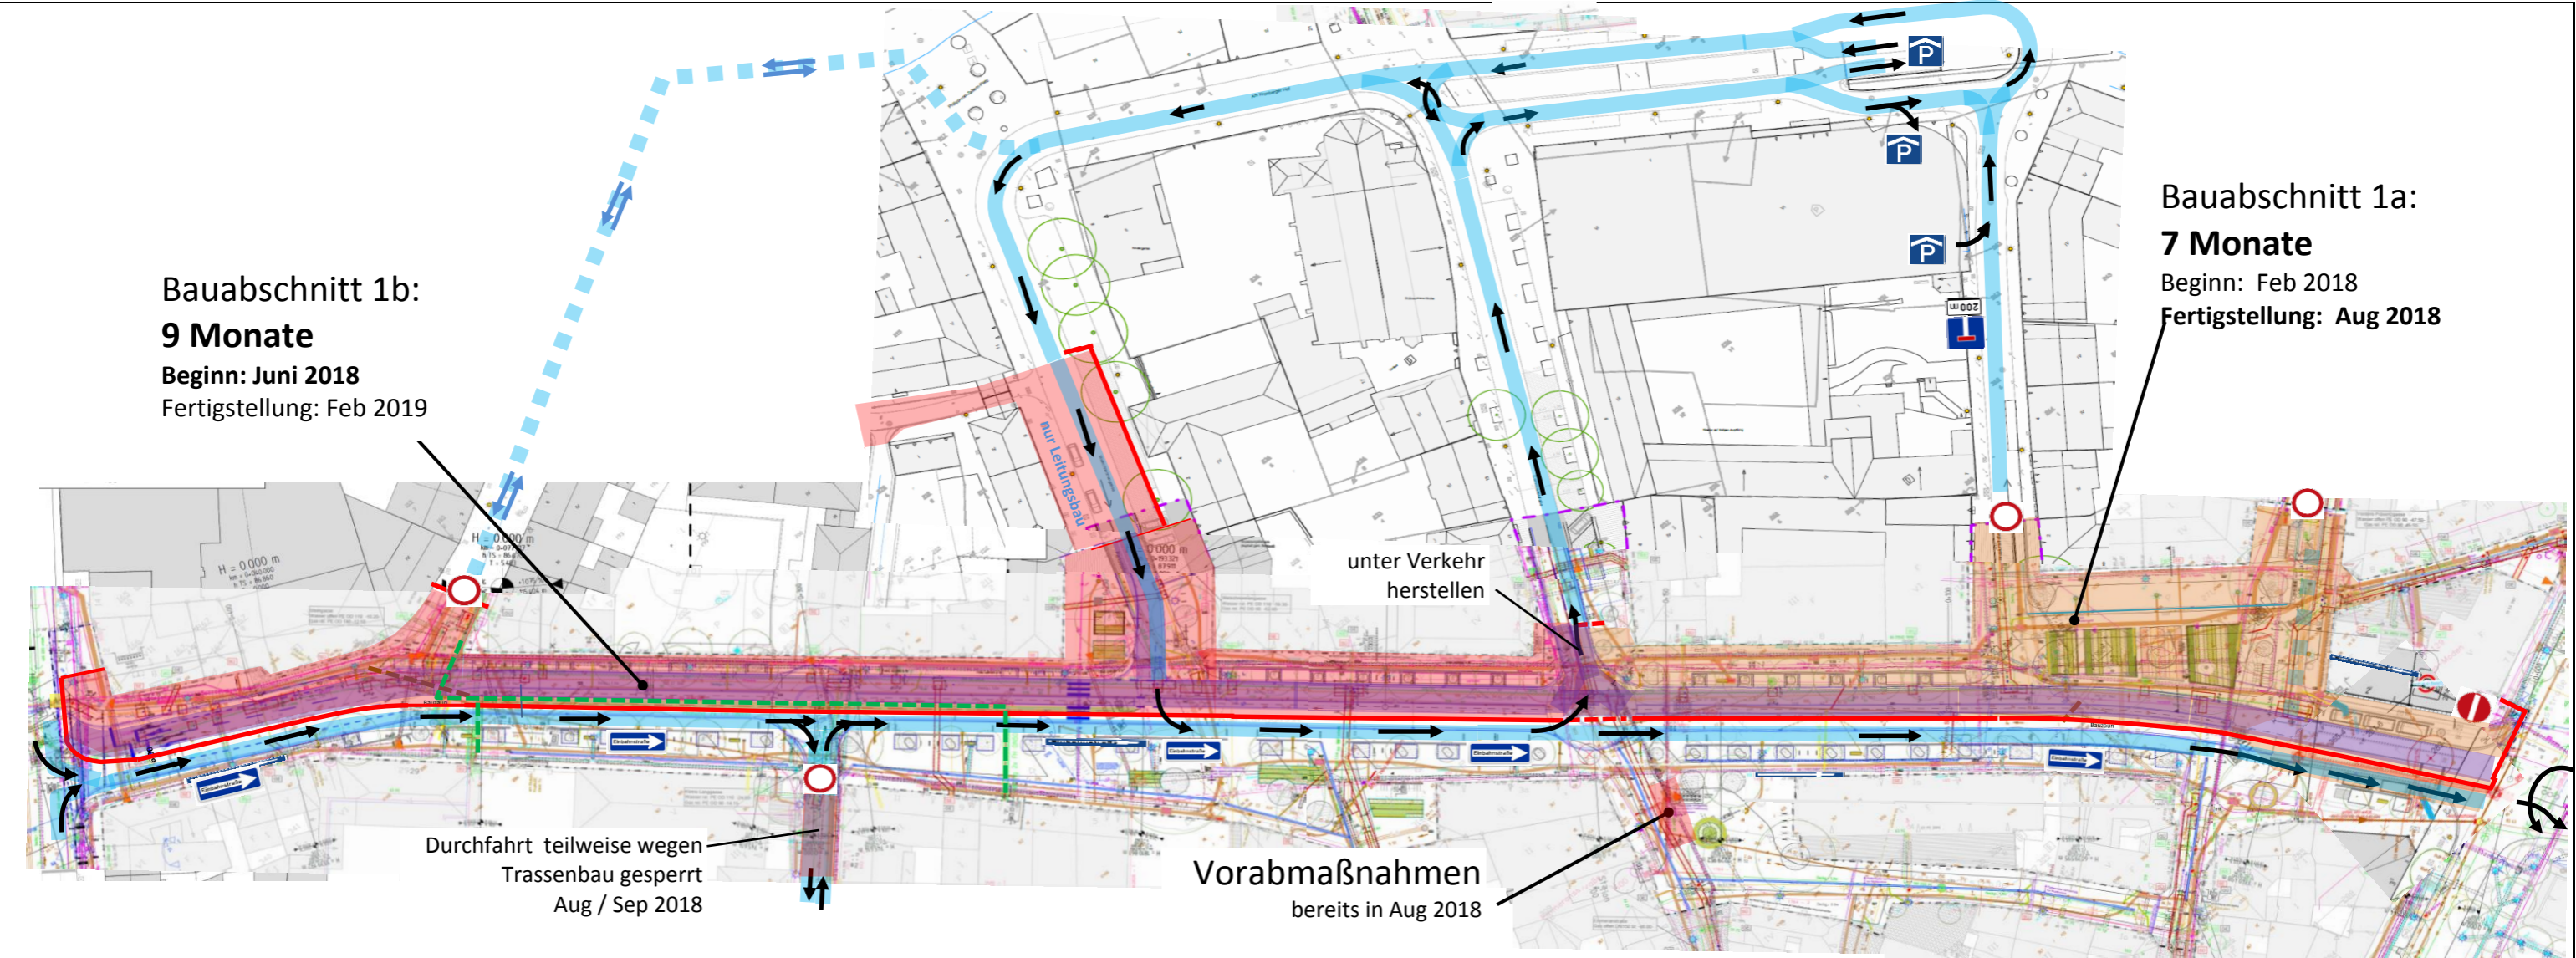

Bauabschnitt 1b:
9 Monate
Beginn: Juni 2018
Fertigstellung: Feb 2019

Bauabschnitt 1a:
7 Monate
Beginn: Feb 2018
Fertigstellung: Aug 2018

Durchfahrt teilweise wegen
Trassenbau gesperrt
Aug / Sep 2018

unter Verkehr
herstellen


Vorabmaßnahmen
bereits in Aug 2018

Legende:

- Verkehrsführung (Fahrstreifen)
- ⇄ Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone)
- Fahrbahn, in Herstellung
- Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung
- Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun)
- Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun)

Bauphase B
Juni 2018 - August 2018

Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
 Grobbauphasen / Verkehrsführung

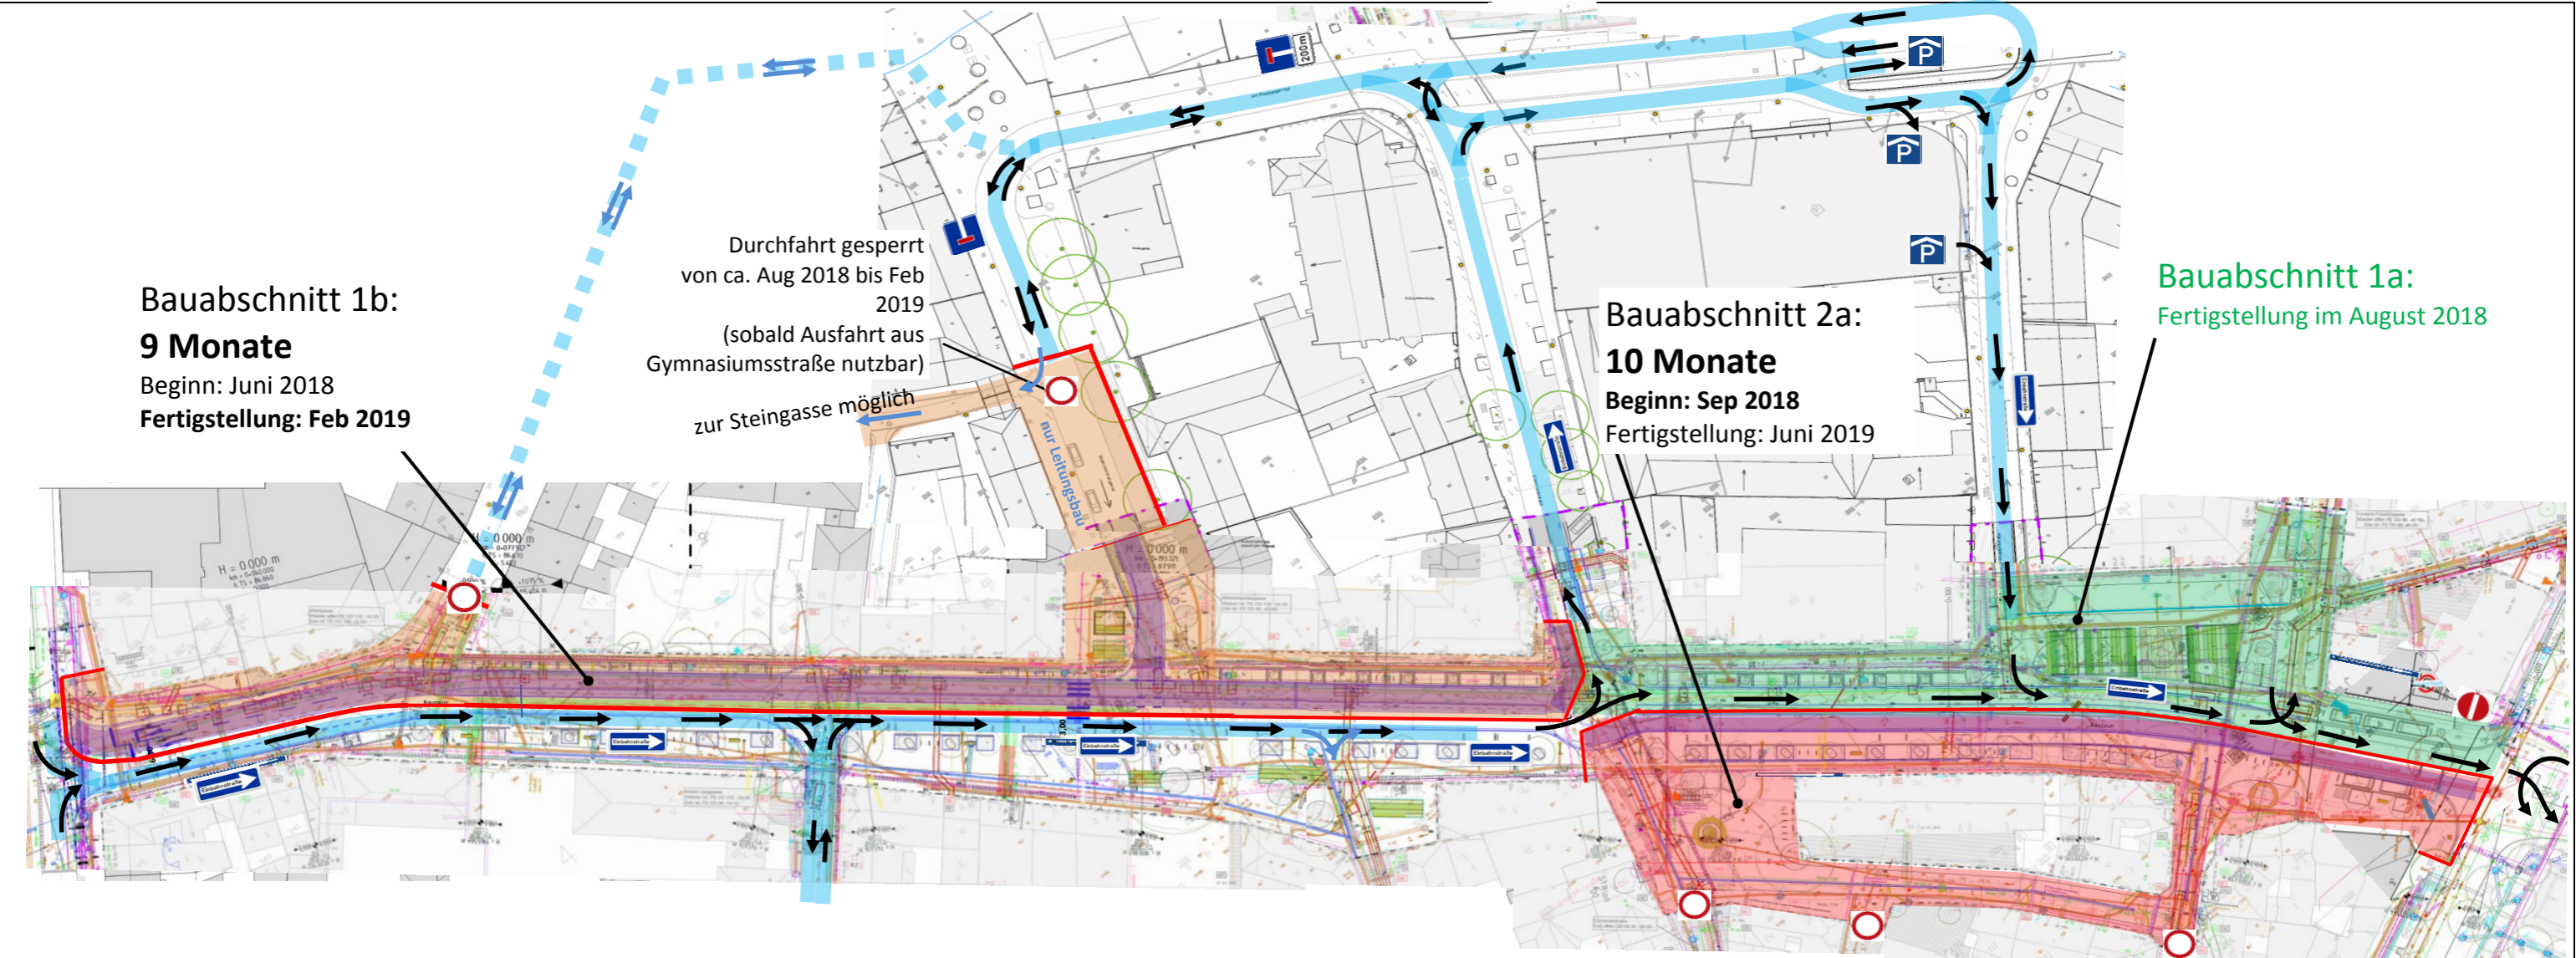


Legende:

- Verkehrsführung (Fahrstreifen)
- Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone)
- Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone)
- Fahrbahn, in Herstellung
- Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbezi.
- Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun)
- Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun)

Bauphase C
September 2018 - Februar 2019

Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
 Grobbauphasen / Verkehrsführung

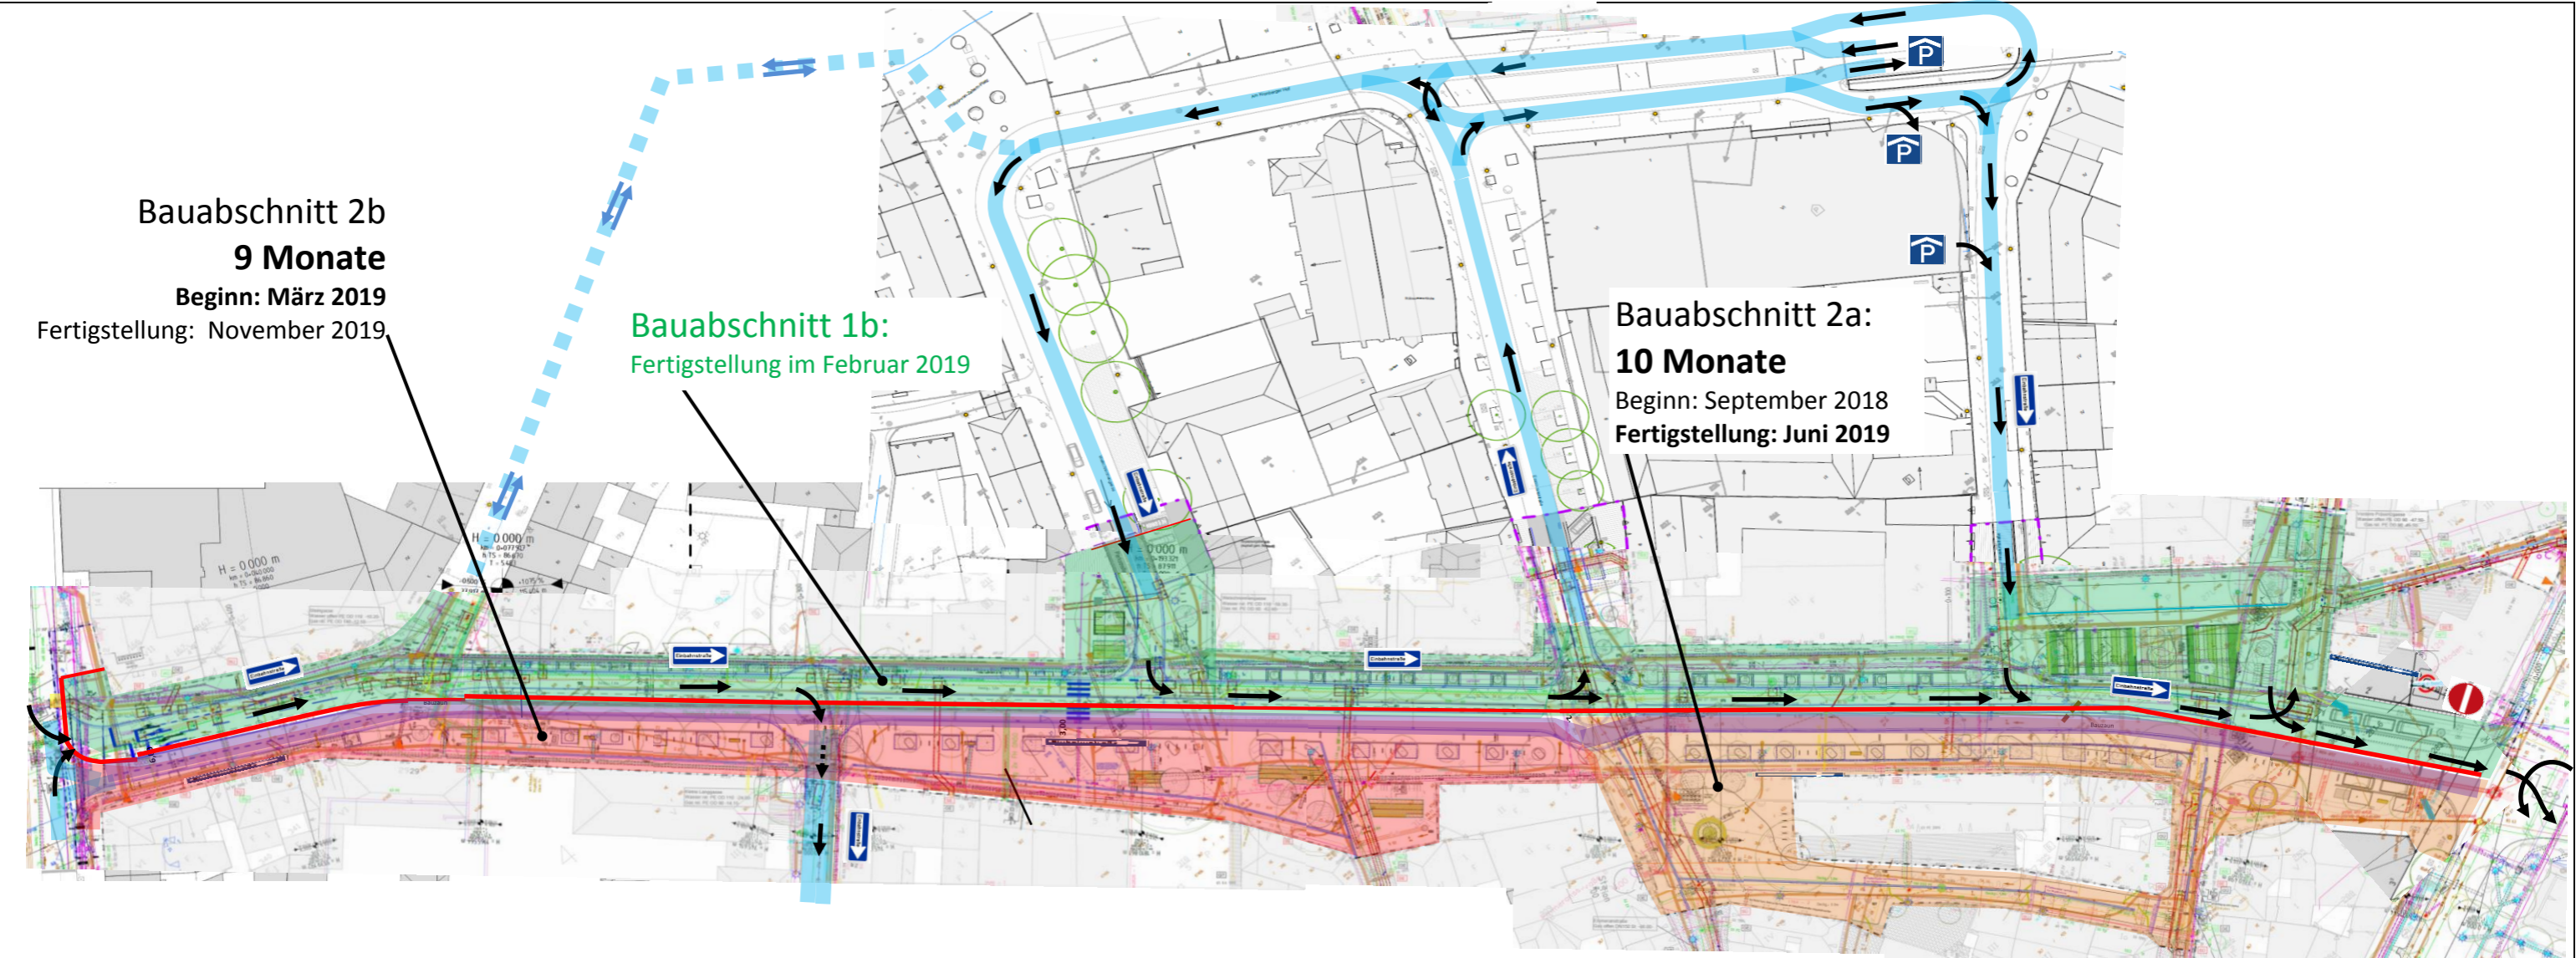

Bauabschnitt 2b
9 Monate
 Beginn: März 2019
 Fertigstellung: November 2019

Bauabschnitt 1b:
 Fertigstellung im Februar 2019


Bauabschnitt 2a:
10 Monate
 Beginn: September 2018
 Fertigstellung: Juni 2019

Legende:

- Verkehrsführung (Fahrstreifen)
- Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone)
- Fahrbahn, in Herstellung
- Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung
- Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun)
- Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun)

Bauphase D
März 2019 - Juni 2019

Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
 Grobbauphasen / Verkehrsführung

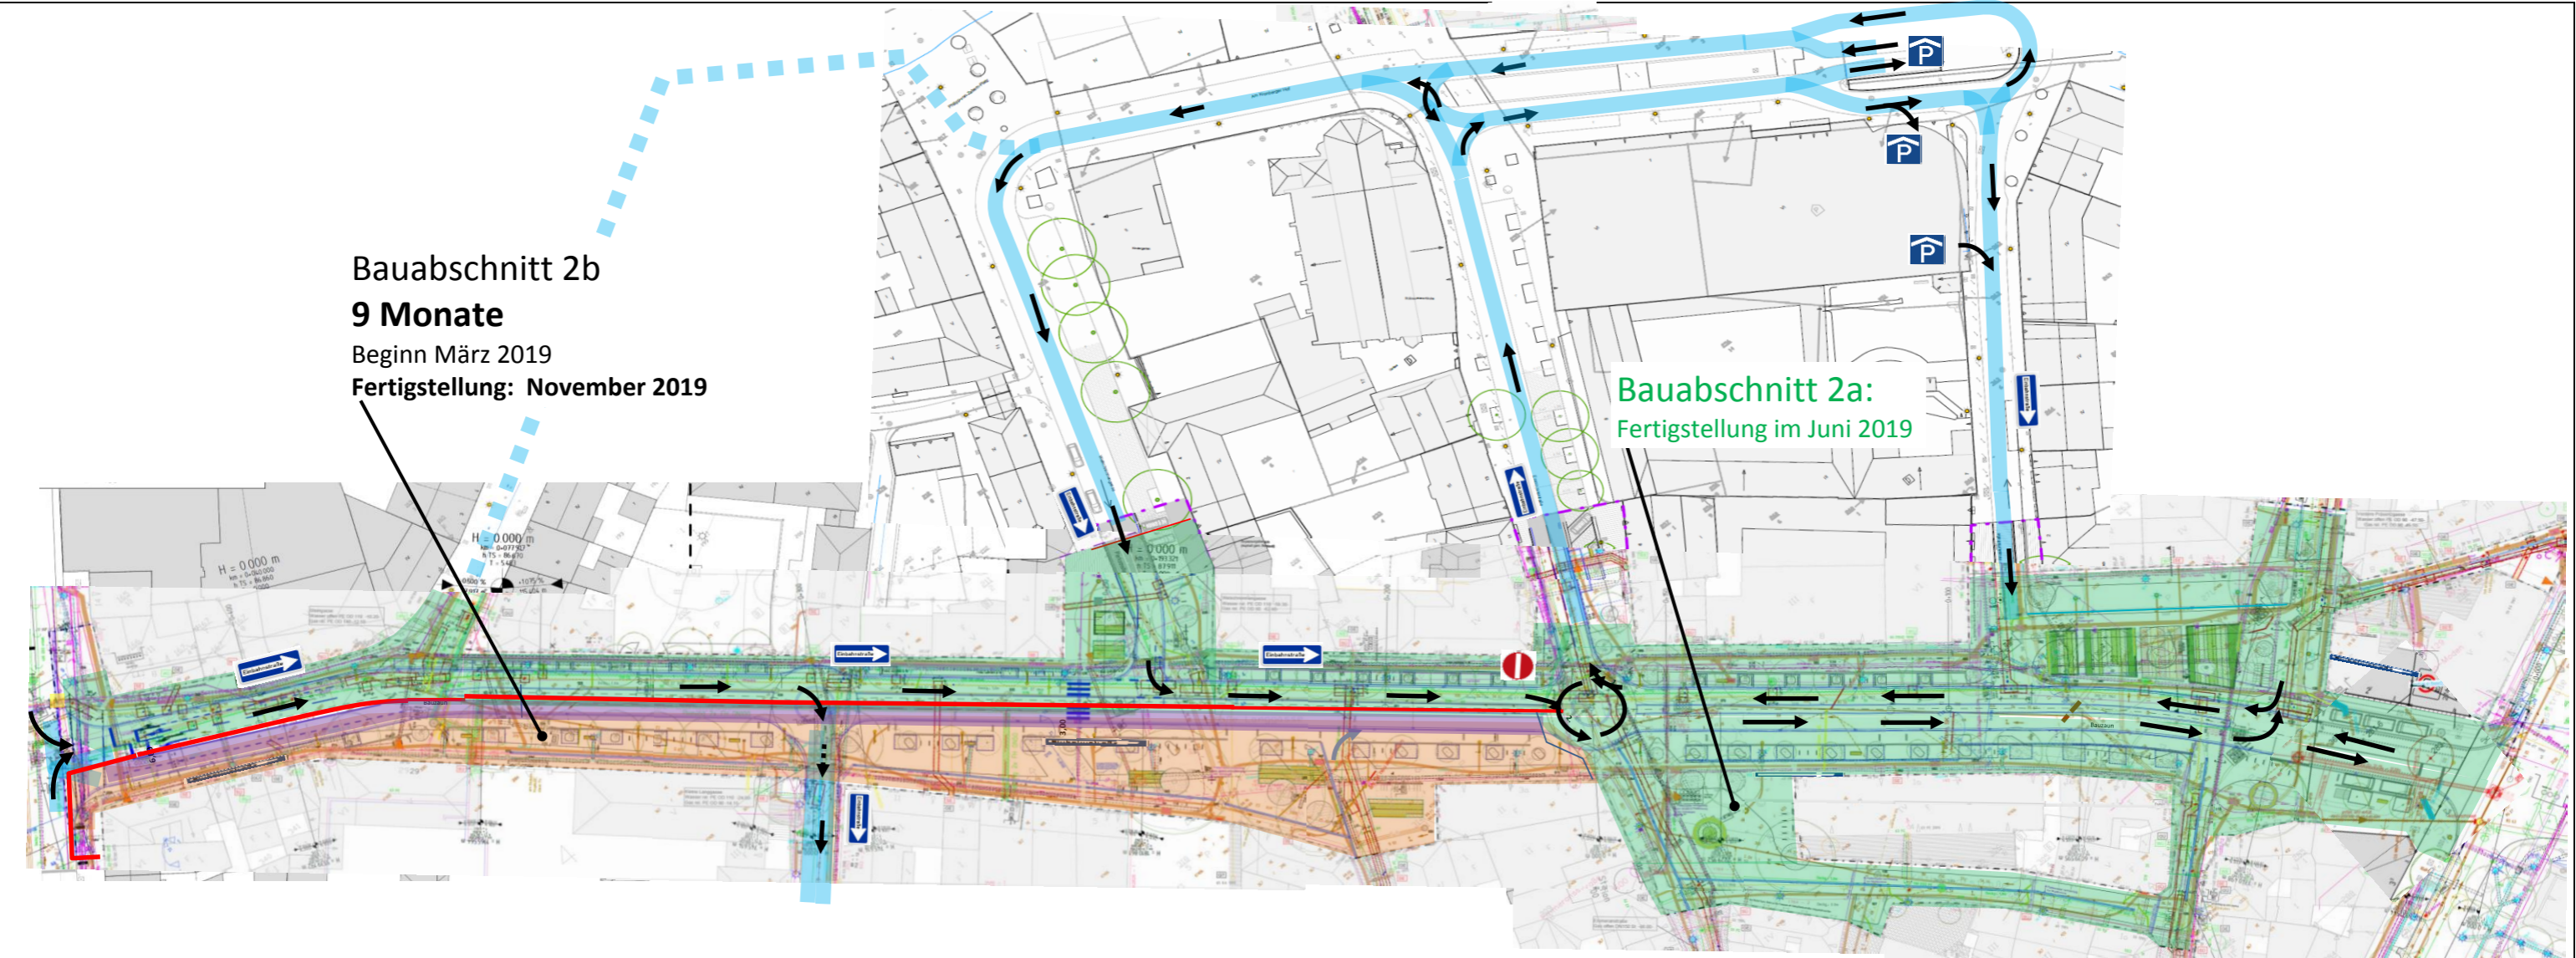

Bauabschnitt 2b
9 Monate
 Beginn März 2019
 Fertigstellung: November 2019


Bauabschnitt 2a:
 Fertigstellung im Juni 2019

Legende:

-
- Verkehrsführung (Fahrstreifen) → Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone) → Fahrbahn, in Herstellung → Flächen, fertiggestellt, inkl. Fahrbeziehung
- Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun) → Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun)

Bauphase E
Juli 2019 - November 2019

Umbau Mainz Langgasse und zwei Plätze
 Grobbauphasen / Verkehrsführung

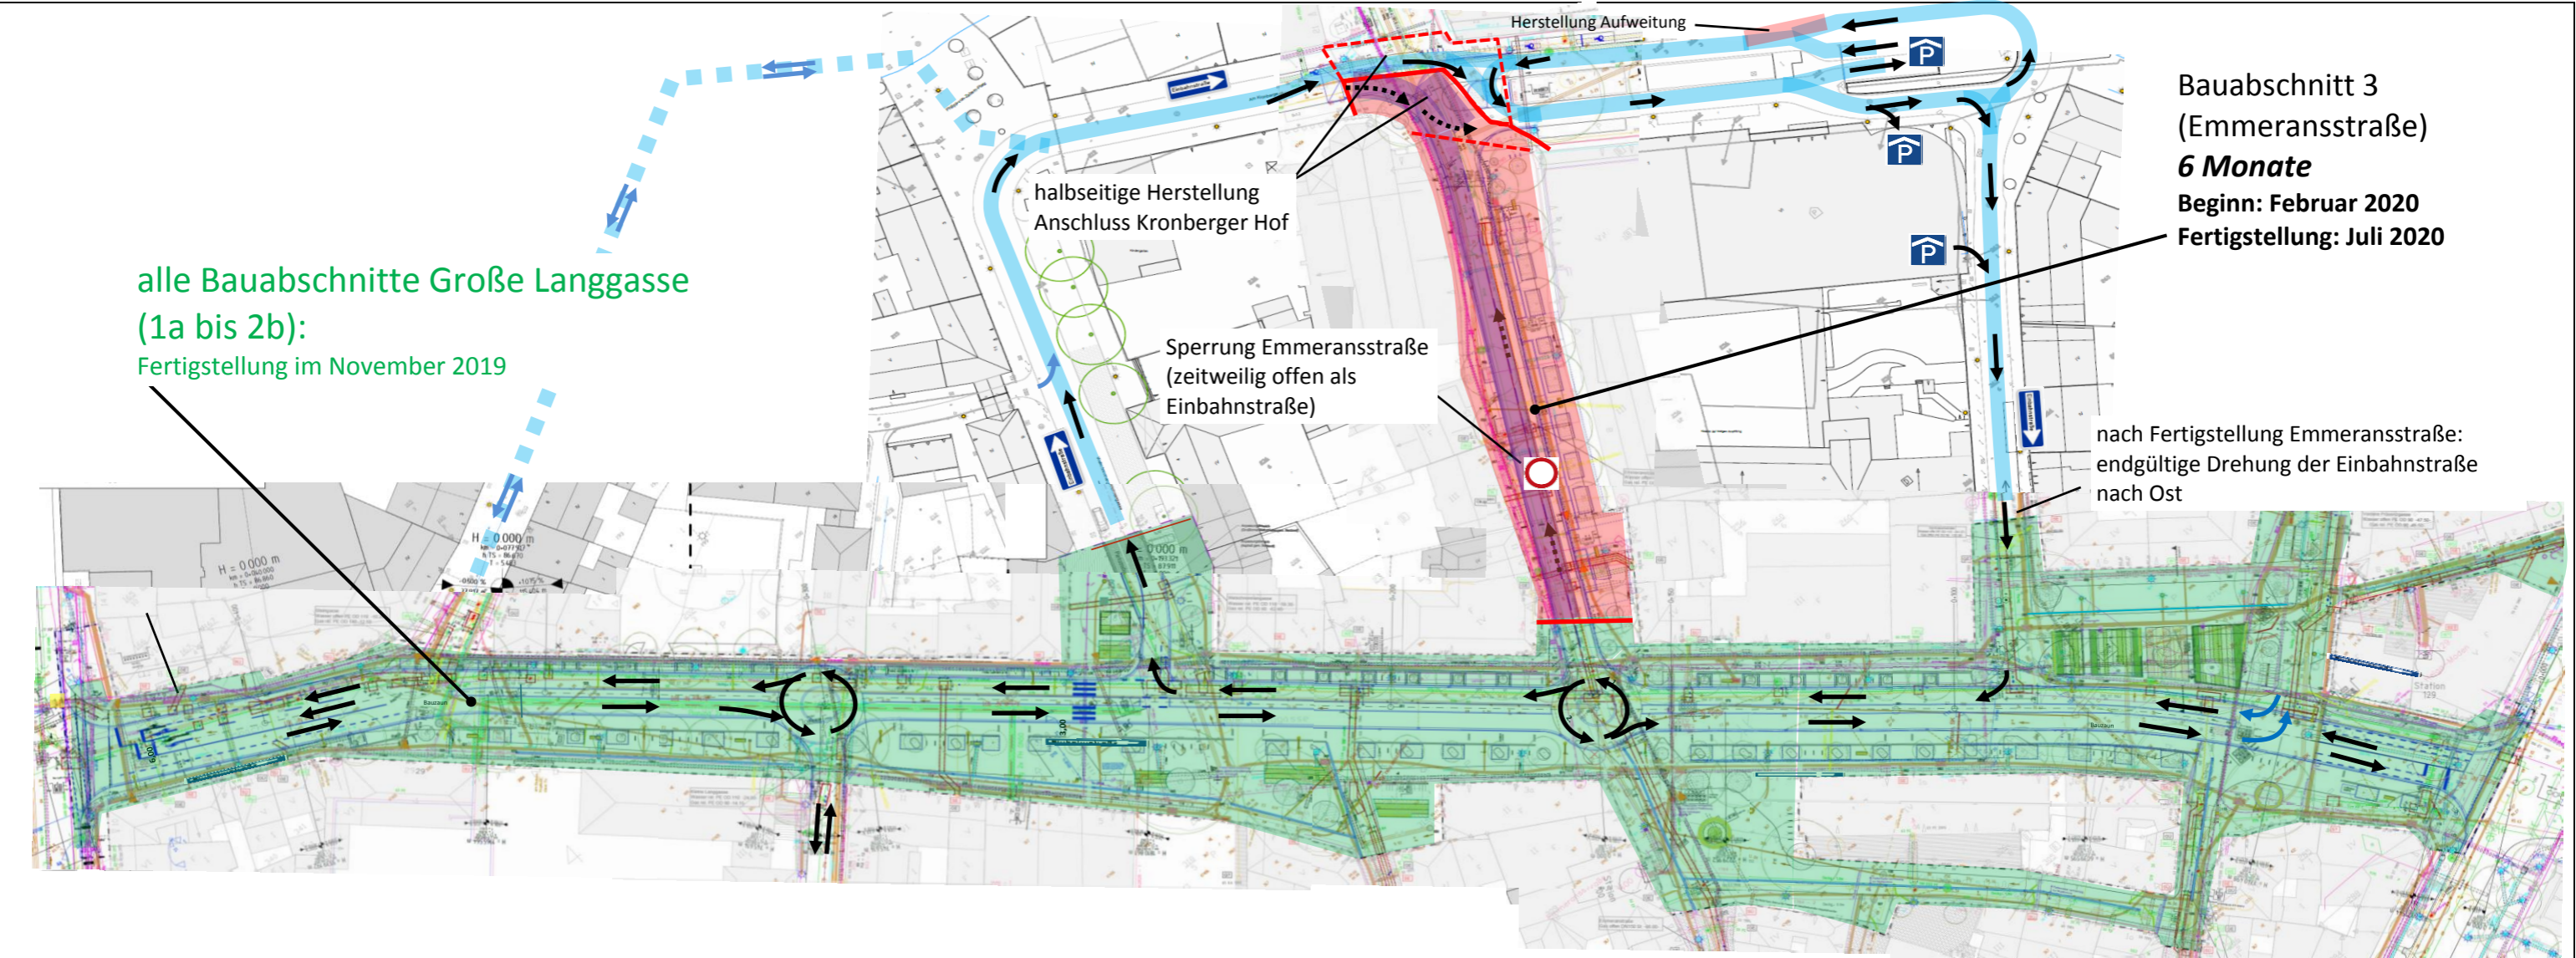

alle Bauabschnitte Große Langgasse
 (1a bis 2b):
 Fertigstellung im November 2019

Bauabschnitt 3
 (Emmeransstraße)
6 Monate
 Beginn: Februar 2020
 Fertigstellung: Juli 2020

Sperrung Emmeransstraße
 (zeitweilig offen als
 Einbahnstraße)

nach Fertigstellung Emmeransstraße:
 endgültige Drehung der Einbahnstraße
 nach Ost

Legende:

- Verkehrsführung (Fahrstreifen)
- Verkehrsführung (untergeordnet, FG-Zone)
- Fahrbahn, in Herstellung
- Flächen, fertiggestellt
- Flächen, in Herstellung gehend (mit Bauzaun)
- Flächen, noch in Herstellung (mit Bauzaun)

Bauphase F (Emmeransstraße)
Februar 2020 bis Juli 2020
